




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA



Programa PDOT	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.		
Programa del POA	Agua Segura en el cantón Pedro Moncayo		
Descripción del programa	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigachi con el 41%.		Objetivo:
			Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad
			Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta este año.
			Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población
		Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.	

Seguimiento		HITOS DEL PROYECTO						
		Para avance programático			Ejecución			
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	19.00	Porcentaje	100	0	x	30/09/2019
2	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	19.00	Porcentaje	100	100	0	30/09/2019
3	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto.	Contrato Acta Entrega Recepción	19.00	Porcentaje	100	0	0	30/09/2019
4	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de planes maestros de agua potable y saneamiento.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	19.00	Porcentaje	100	0	0	30/09/2019
5	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	19.00	Porcentaje	100	0	0	30/09/2019
6	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	9	0	30/09/2019
Avance financiero				Codificado				
		Inicial		Reforma	Ejecutado			
		GAD MPM	\$ 372,717.83					150,000.00

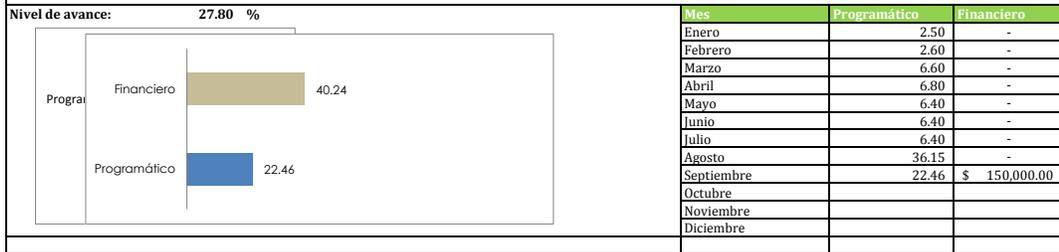

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019

	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios		
Junio, 2019:	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desiertos en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios		
Julio, 2019:	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desiertos en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios.		
Agosto, 2019:	Avances: 1. 2.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Septiembre, 2019:	Avances: 1. Presupuesto para la contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi) transferido a EMASA para su ejecución. 2. Presupuesto para la Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma en San José Alto transferido a EMASA para su ejecución; mediante certificación presupuestaria No. 198, cuyo monto es 62717,82	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2019
