




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado.		
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento		
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		<b>Objetivo:</b>
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático			Ejecución					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional		Porcentaje	100	98	x	30/06/2022
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes		Unidad	12	6	x	30/06/2022
	<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>						
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>				
GAD MPM		\$	40.000,00		-			\$	-

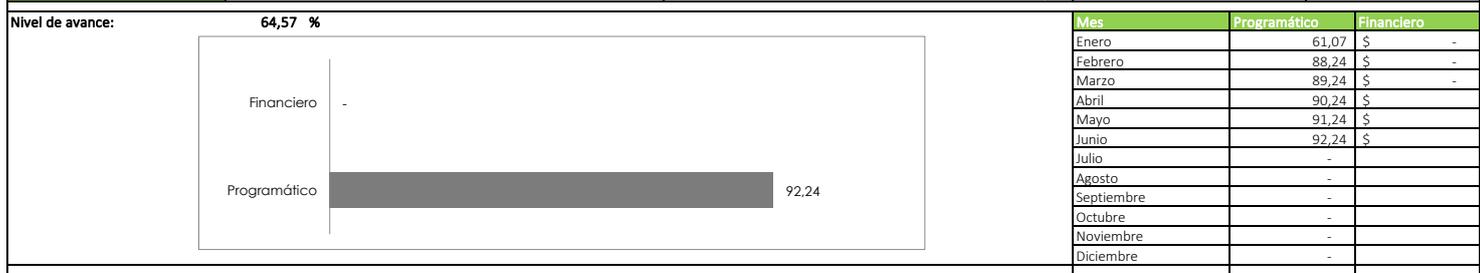

		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	<b>Avances:</b> Se cuenta con un avance de 98%  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
Febrero, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
Marzo, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo porcentaje  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
Abril, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022
Mayo, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/05/2022
Junio, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/06/2022
