




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado		
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento		
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		<b>Objetivo:</b>
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático			Ejecución					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	30/06/2022
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	6	x	30/06/2022
	Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD MPM			\$	310.124,58		-		\$	-

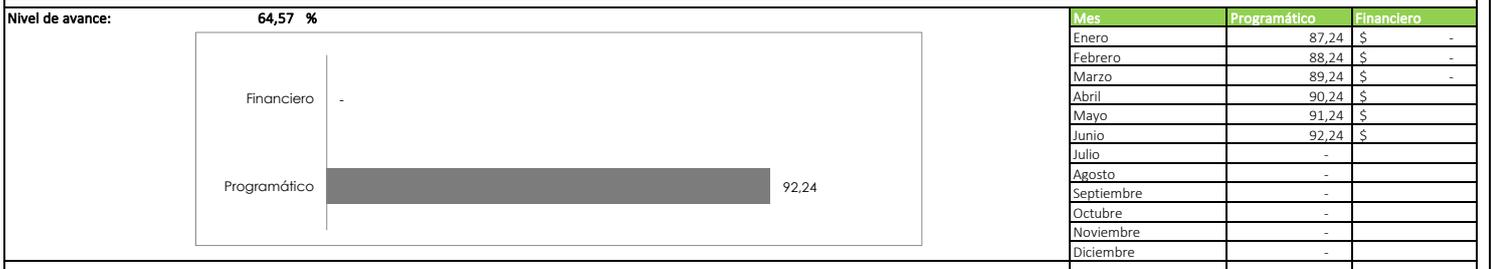

		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	<b>Avances:</b> Se cuenta con un avance de 80%  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
Febrero, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
Marzo, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
Abril, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022
Mayo, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/05/2022
Junio, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/06/2022
